


# Infomøte Tanum Vel – 21.06.2022

Kattås **Vannbehandlingsanlegg**




# Nytt vannbehandlingsanlegg - Organisasjonsplan

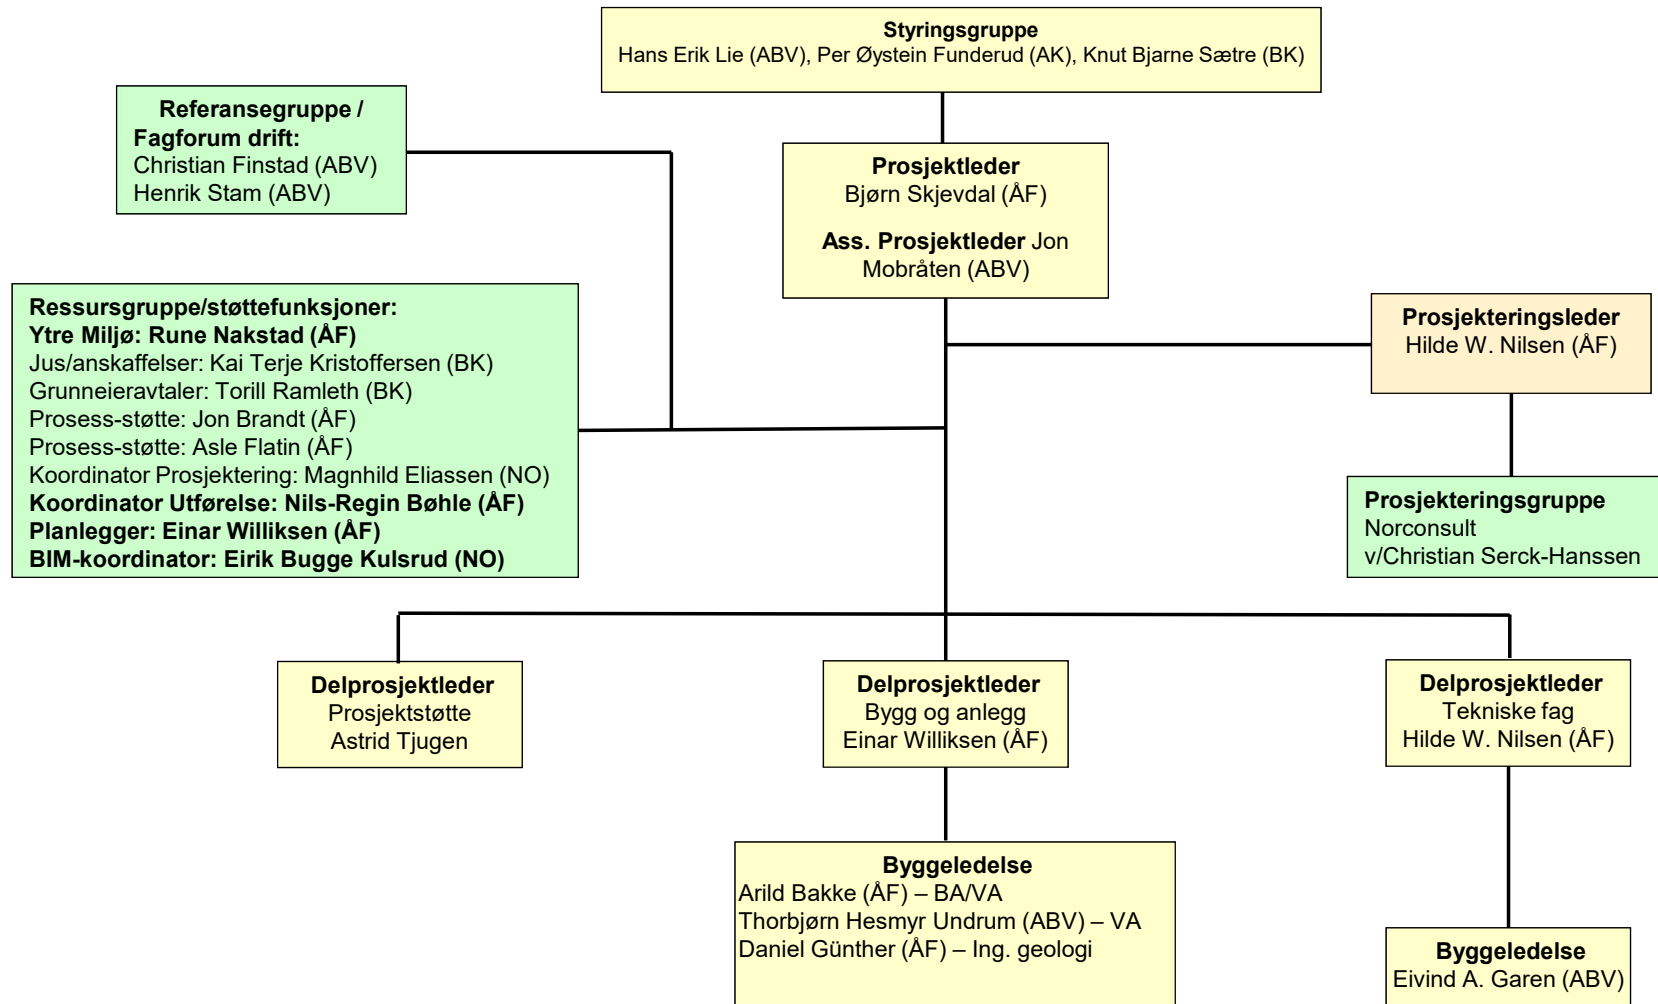

# Status avløpsledning fra Kattås til Billingstad


- ✓ Oppstart våren 2021
- ✓ Ferdig sommeren 2022
- ✓ Utførende entreprenør: Isachsen Anlegg AS

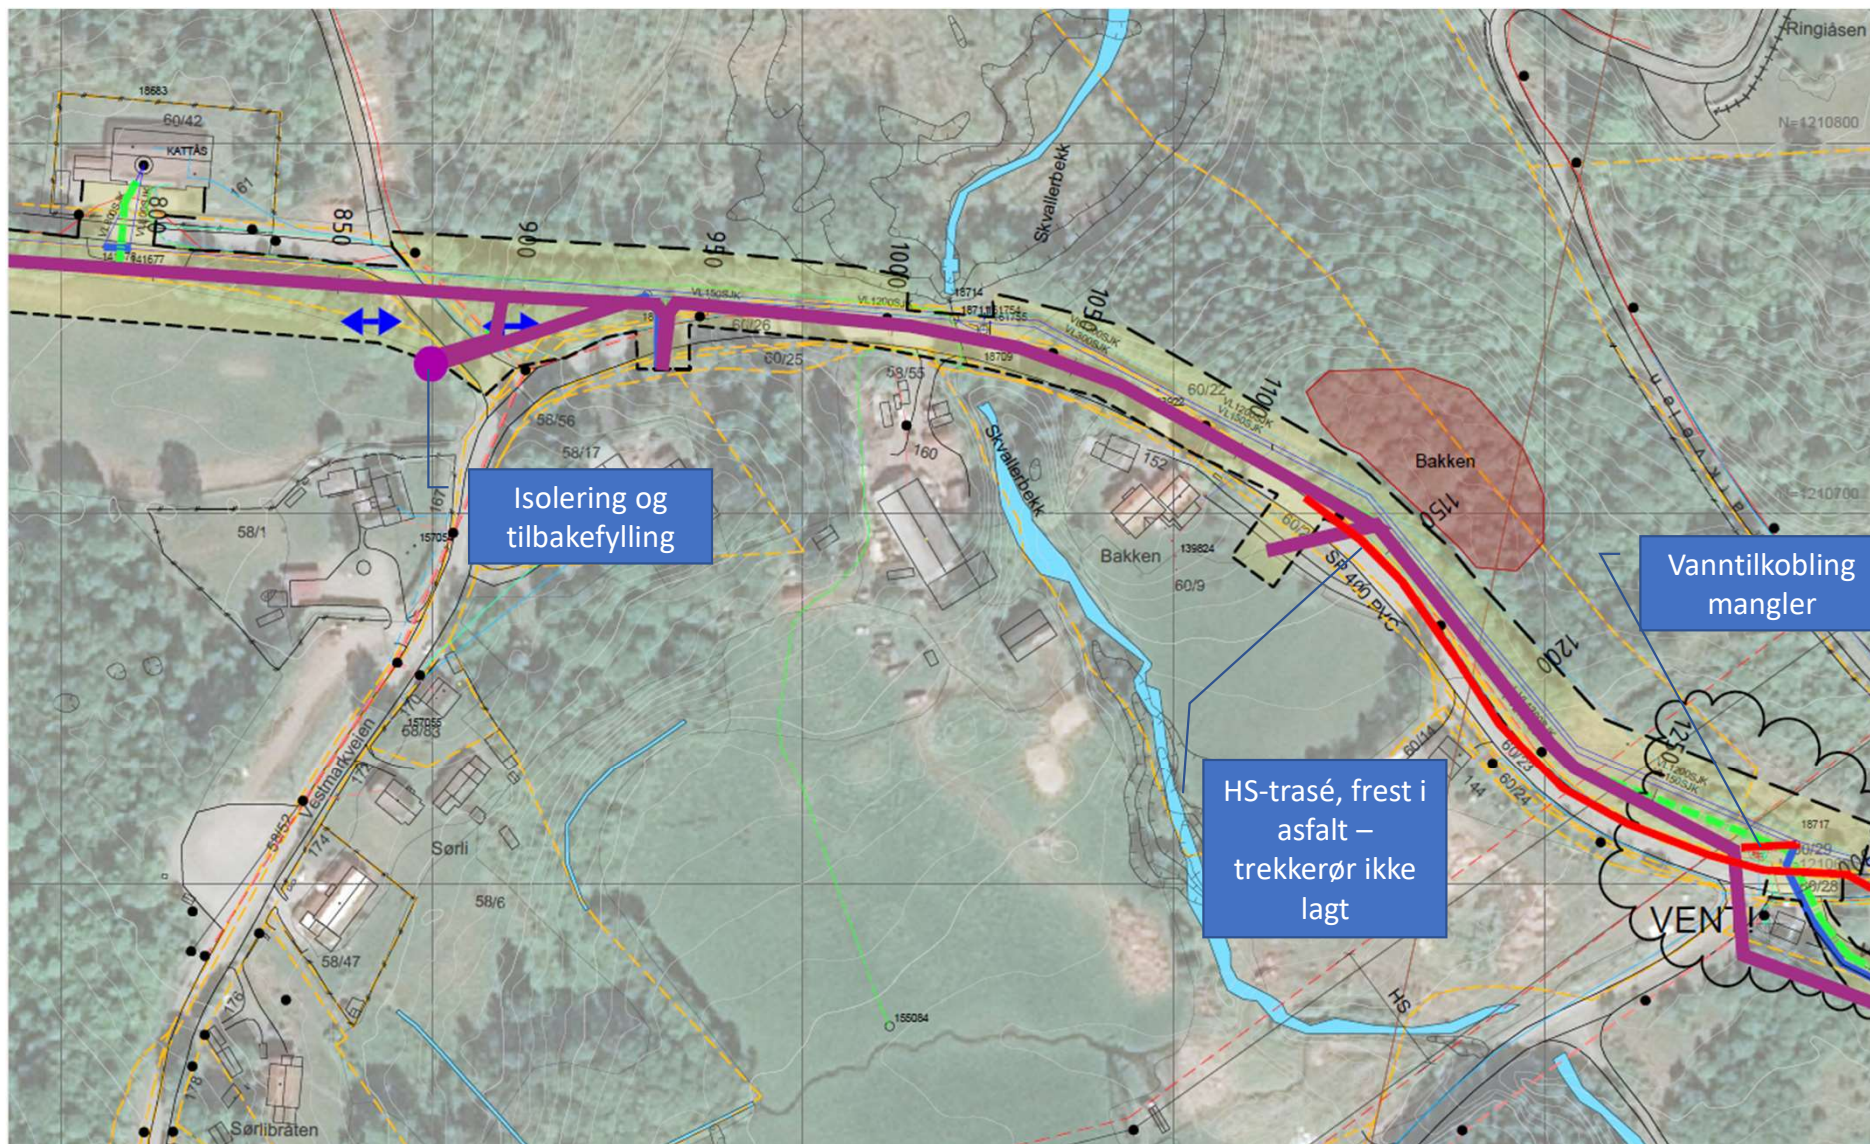

Pågår

Ferdig




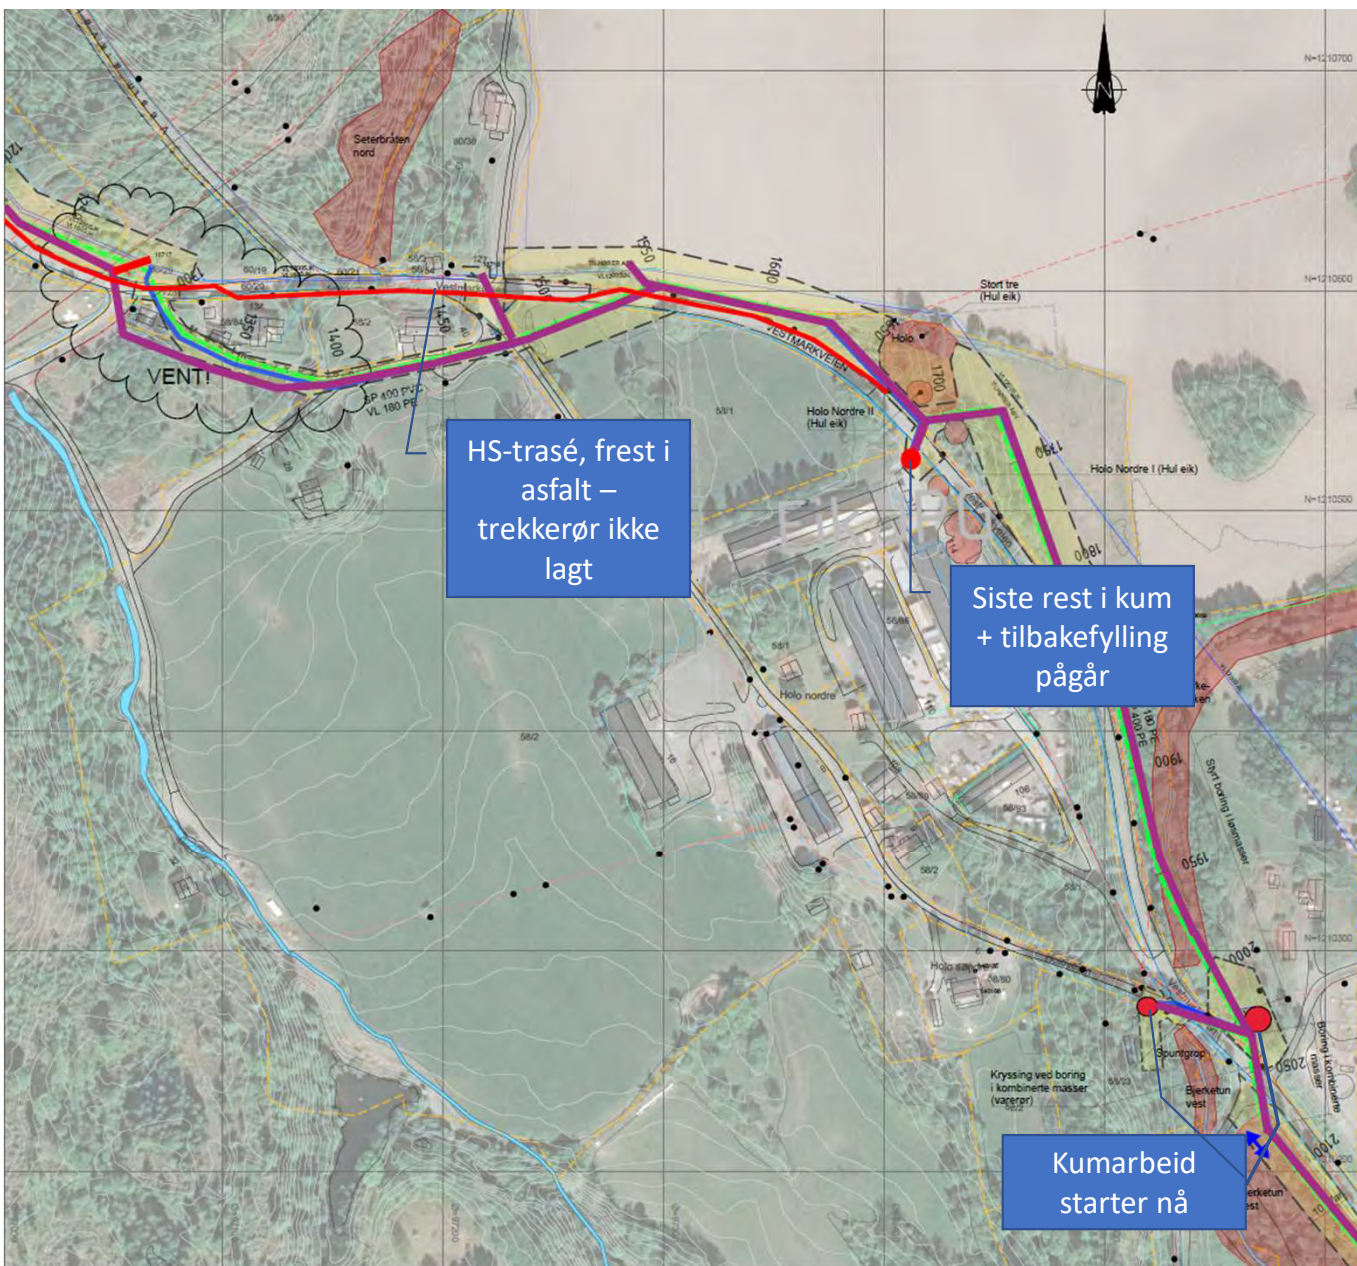

Pågår

Ferdig



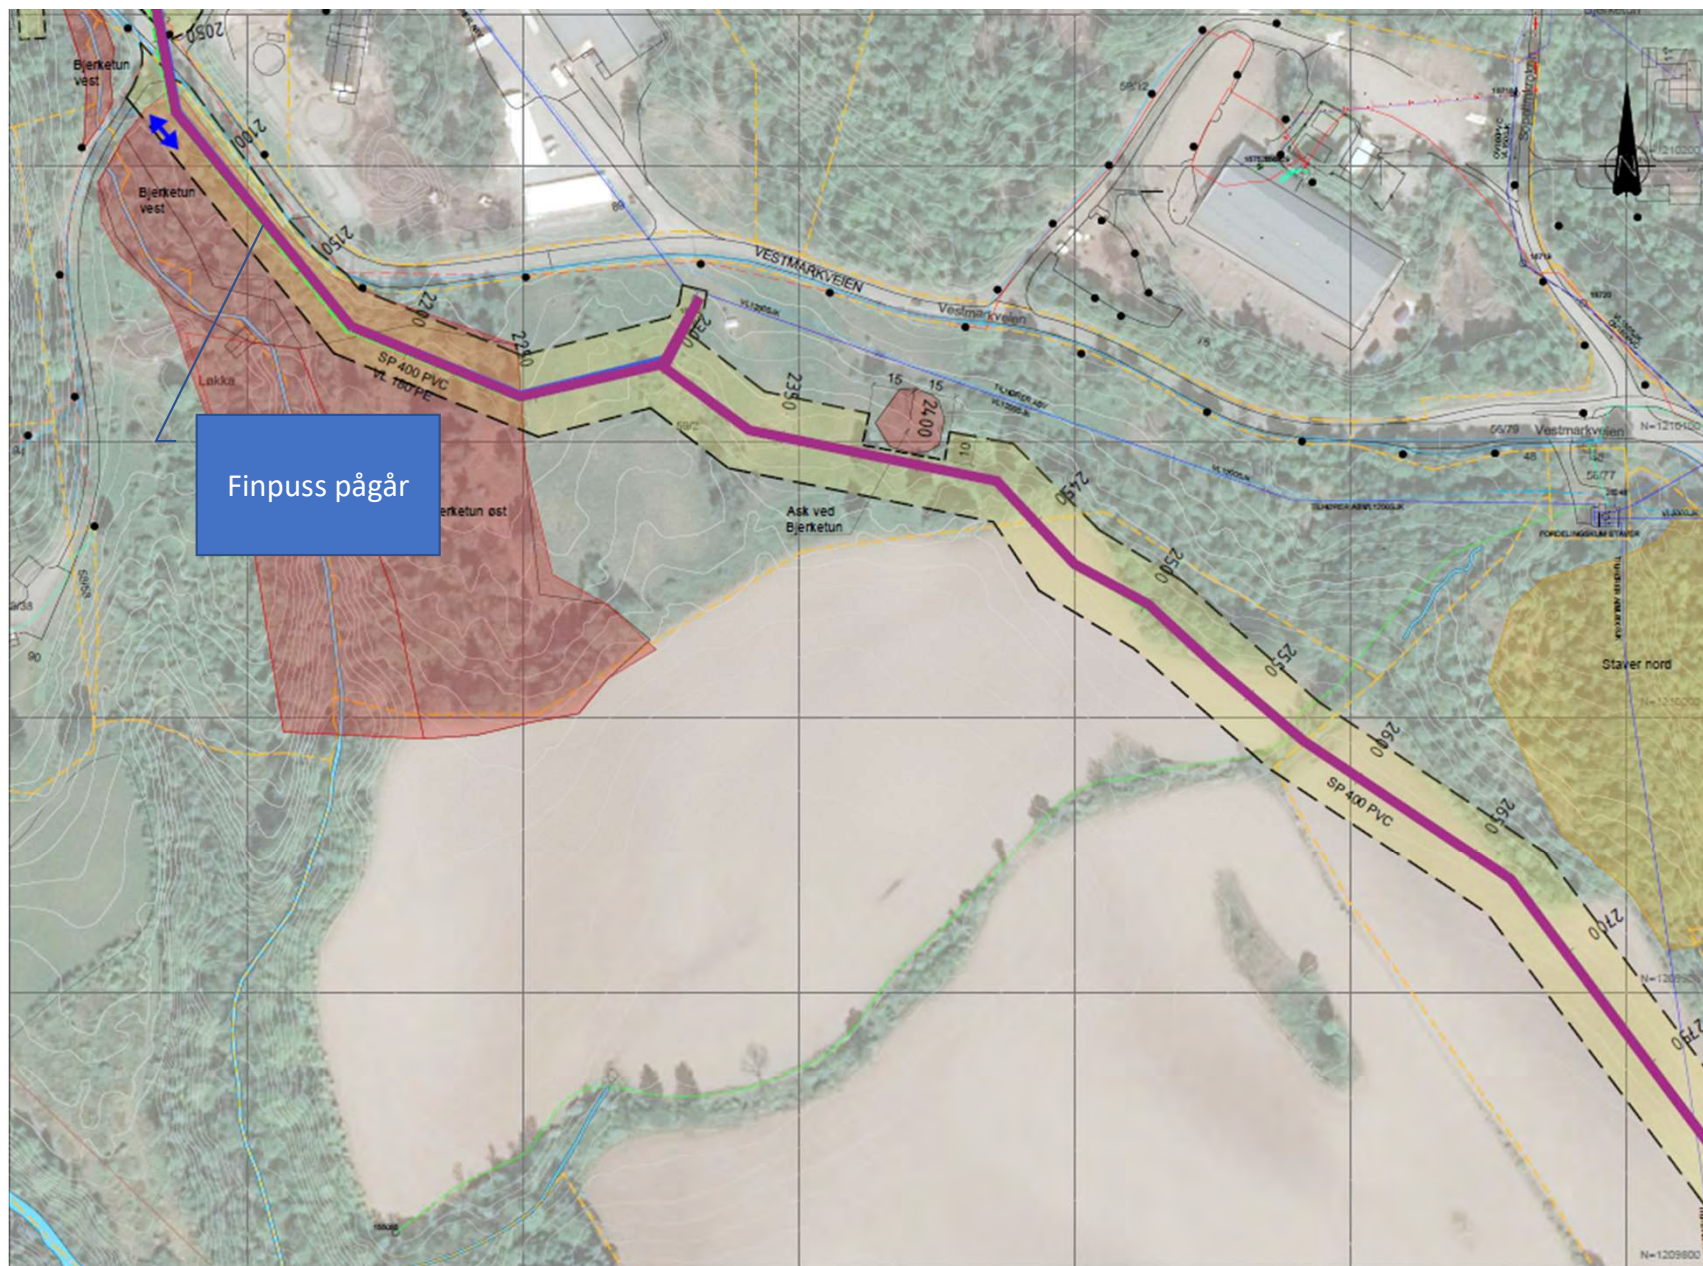


Pågå

Ferdig

Pågår

Ferdig

Strekning  
komplett

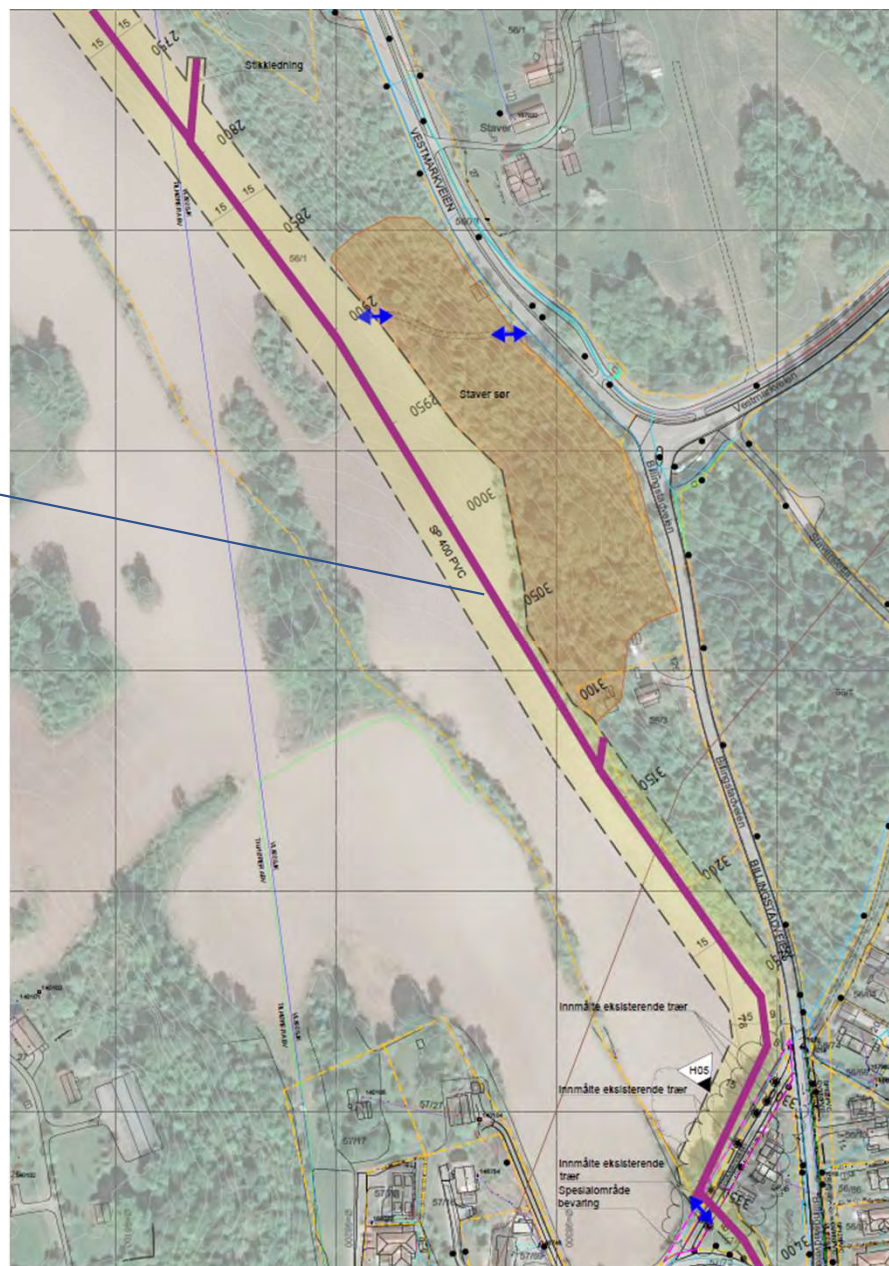





Pågår

Ferdig

Asker er komplett







# Støy- og støvmålinger

✓ Støy- og støvmålinger gjennomføres kontinuerlig

## Støymålinger

| Målepunkt                                        | Gjennomsnitt April |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
|                                                  | dB Lmax            | dB Leq |
| Vestmarkveien 161                                | 47,5               | 40,7   |
| Vestmarkveien 167<br>(Parkeringsplass<br>Kattås) | 52,1               | 41,6   |

**Støykrav dagtid** ( $L_{pAeq12h\ 07-19}$ ):      **60**      **dB**

(Jf. TA-1442)

**L<sub>Aeq</sub>** = gjennomsnittsstøy i dBA i en nærmere angitt tidsperiode T

**L<sub>AFMax</sub> = dBAFMax** høyeste støyverdi i perioden, med støymåler innstilt på Fast, dvs. at den oppgir høyeste gjennomsnitt i en periode på 0,125 s.



## Støvmålinger



Støvmåling siste periode :

9,34 g/m<sup>2</sup>

Krav: 5g/m<sup>2</sup>

\*Målepunkt ved Vestmarkveien 161

Det er påvist overskridelser for mai måned - 16dagers måling.


Målingen er utført før støvmåleren ble flyttet nærmere naboer for å få en mer representativ måling.

### Tiltak:

- ✓ Våren 2022 har vært en veldig tørr periode
- ✓ Vanskelig med vanning i kalde perioder
- ✓ Legge knust asfalt på veien fra kryss Vestmarkveien og delvis opp til nytt vannbehandlingsanlegg
- ✓ Vanning og dustex ved behov




# Turstier i Kattås-området sommerhalvåret

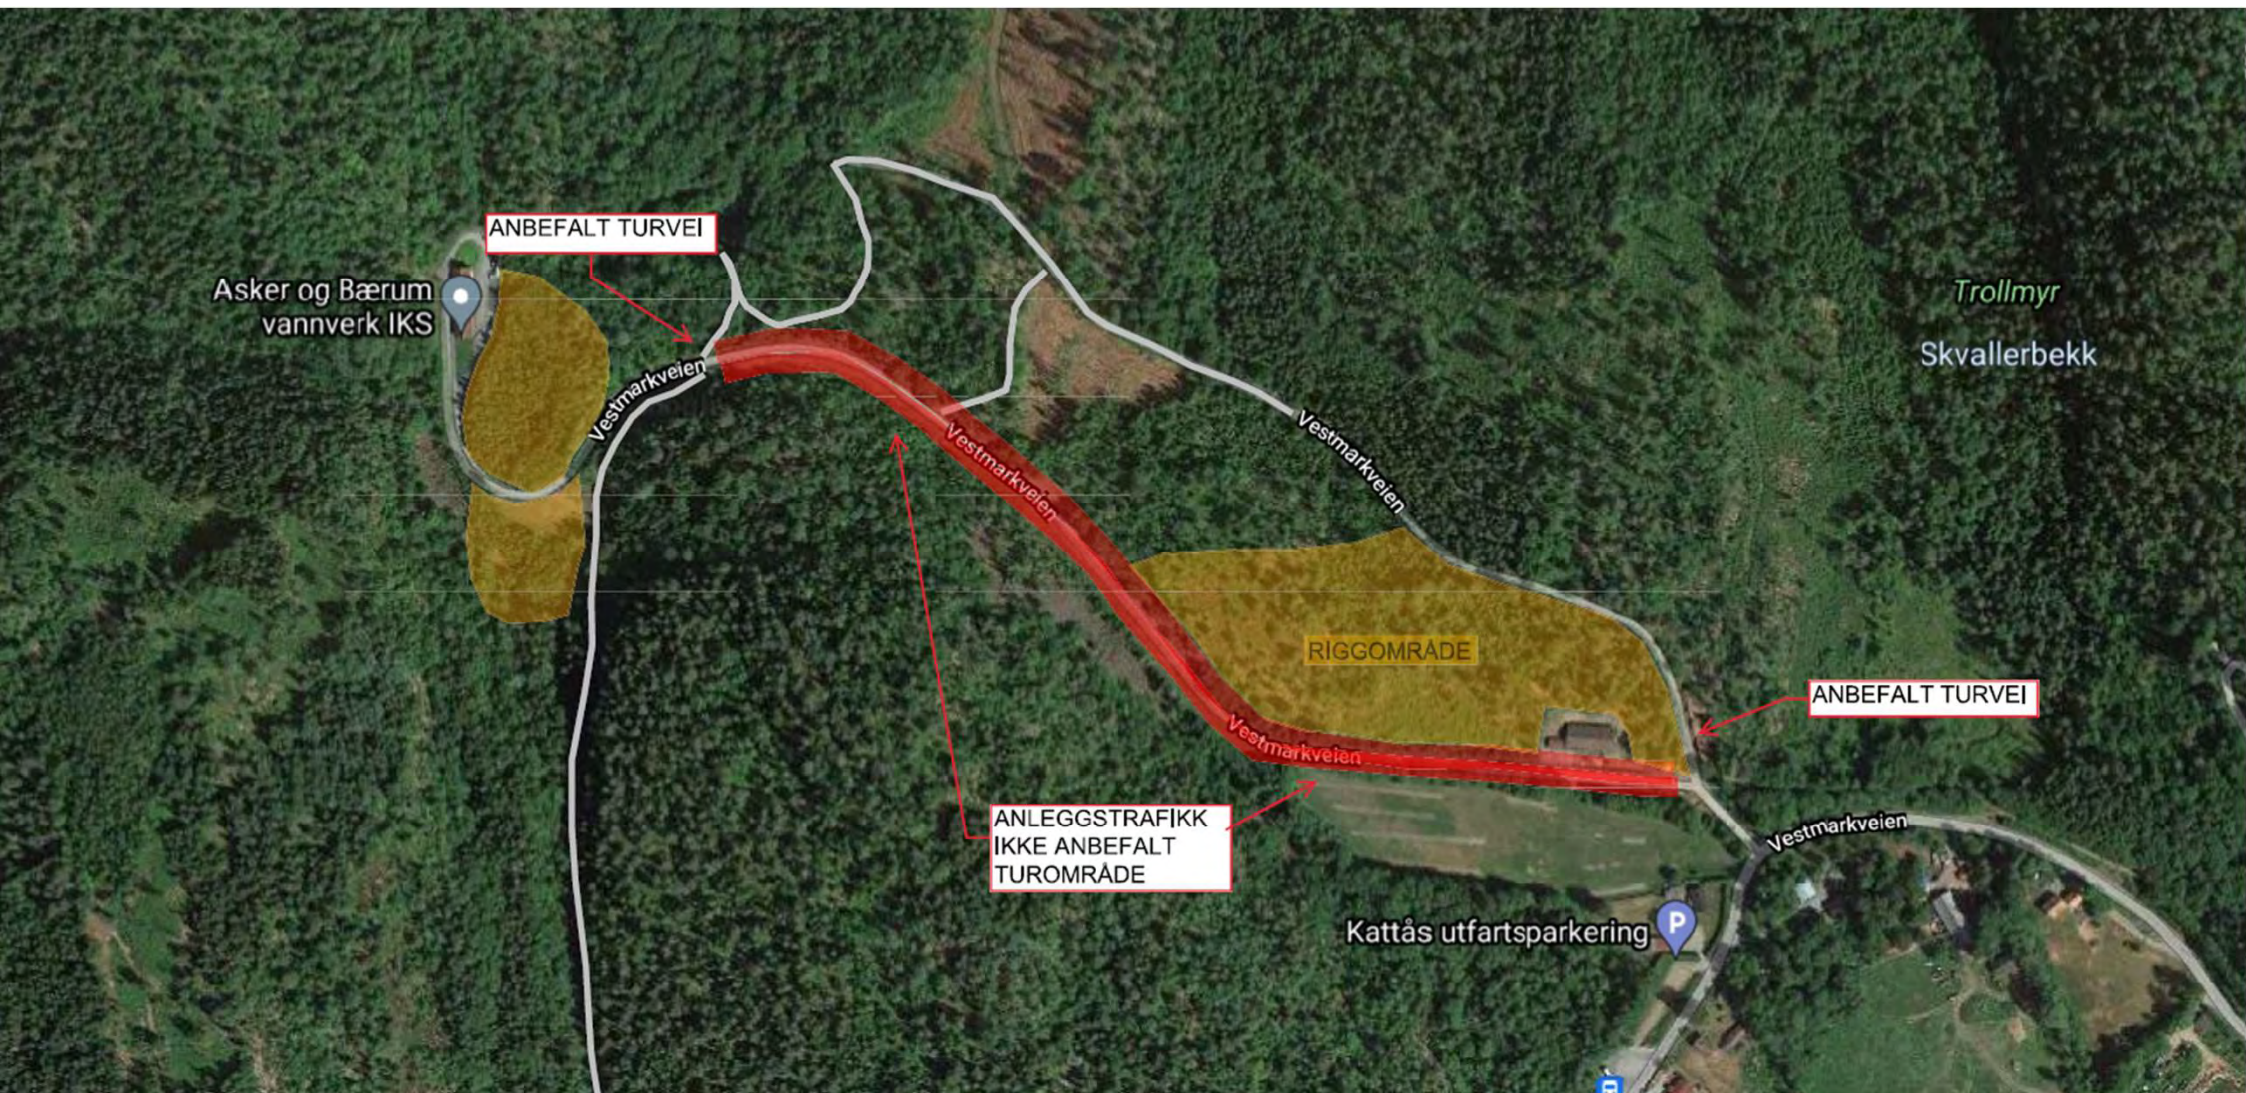



# Turstier i Kattås-området vinterhalvåret

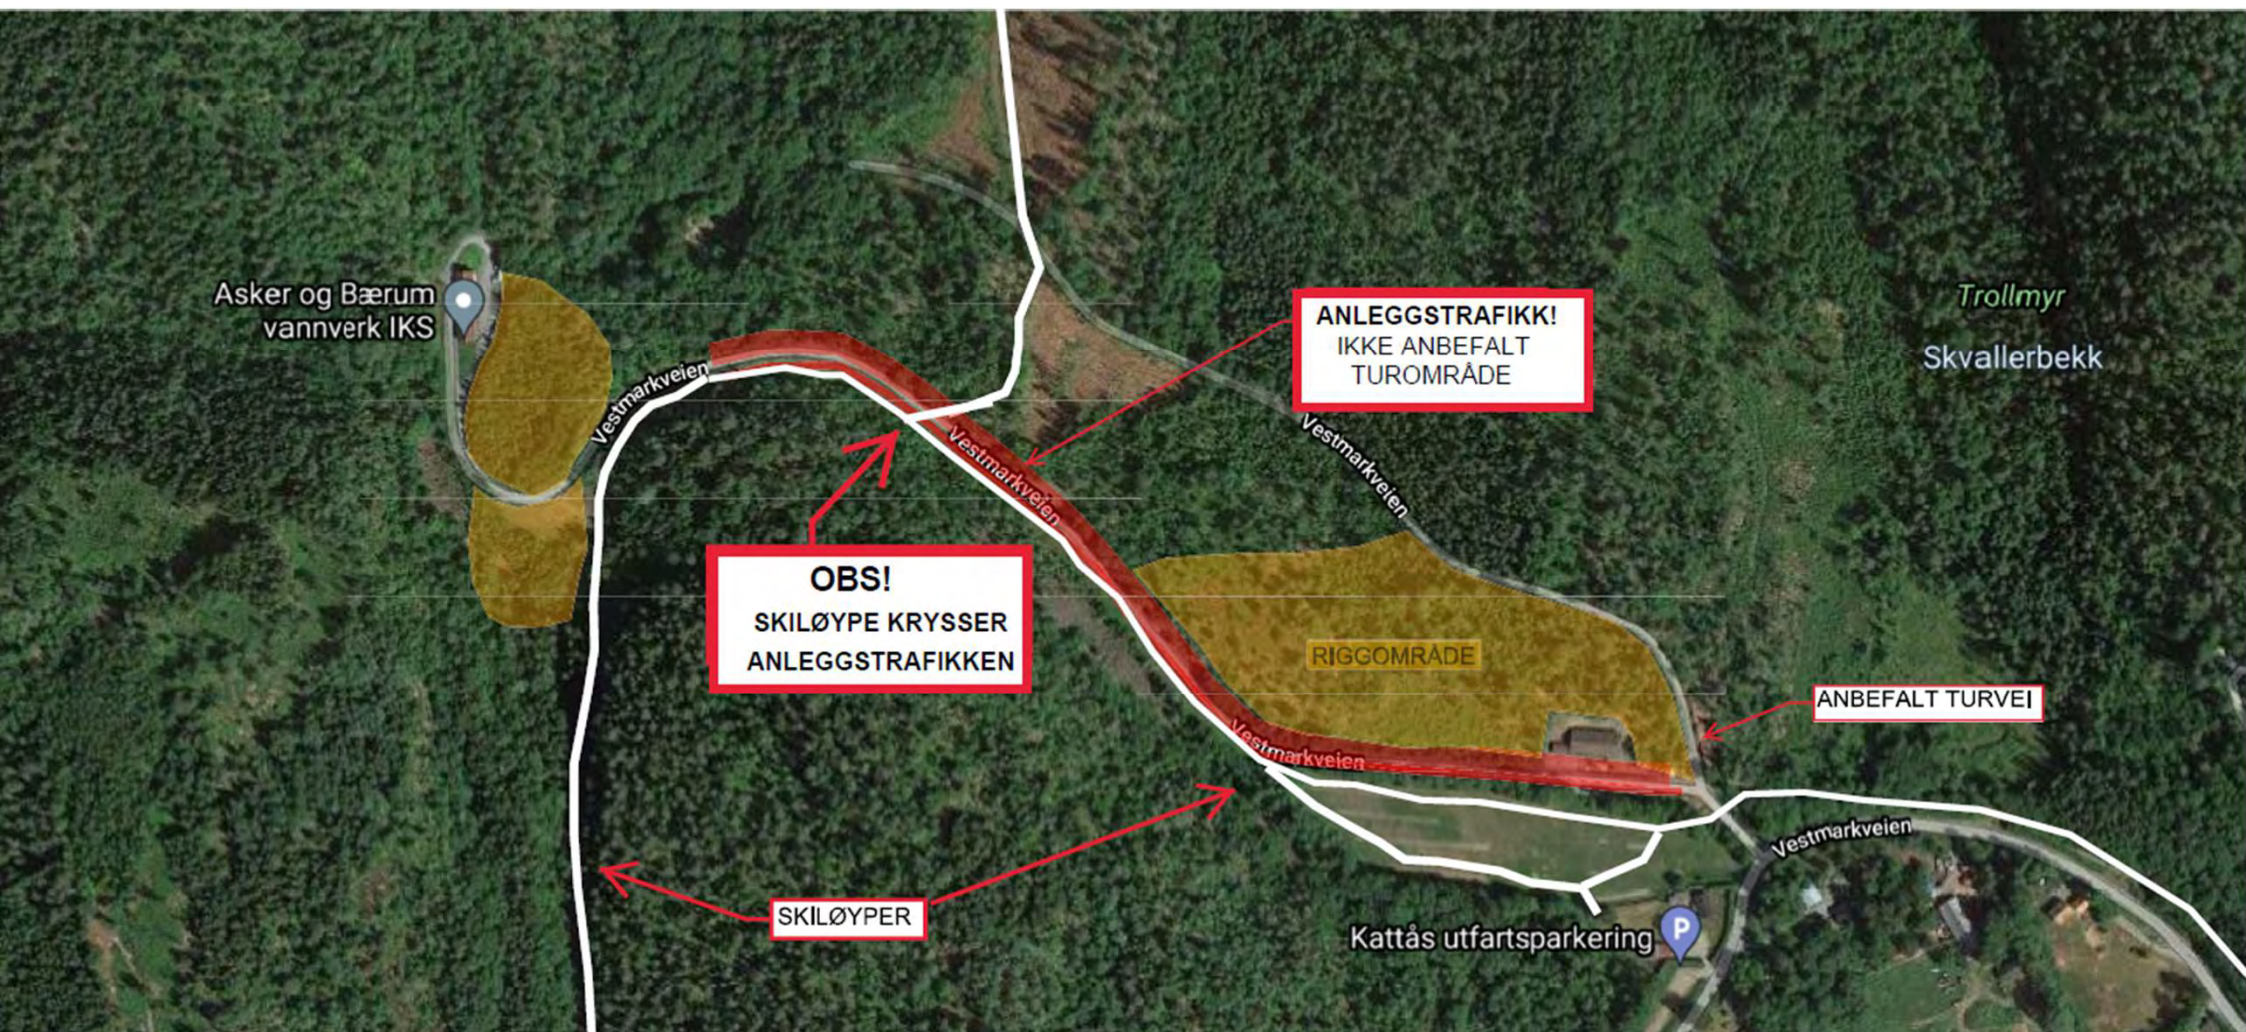



## Transport av bergmasser ca. 01.08.22 – ca. 15.12.23

- Entrepriise K-205 Berg- og betongarbeider tildelt Veidekke Entreprenør AS
- Ca. 285.000 m<sup>3</sup> bergmasser skal transporteres ut på offentlig vei
- Massene fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependsveien og videre til Franzefoss på Steinskogen
- All anleggstrafikk vil kjøre forbi Tanum skole, Tanum Barnehage og Bjørnegård skole
- Tiltak for å sikre myke trafikanter
- Utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 på skoledager



## **Trafikksikringstiltak**

Bærum kommune har i rammetillatelsen satt følgende vilkår knyttet til trafikksikkerhet og at tiltak beskrives i IG-søknad:

**‘Anleggstrafikk, bl.a. utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien, skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00, jf. reguleringsbestemmelsenes § 2.4. Byggherrens tiltak mht. sikkerhet for myke trafikanter forutsettes gjennomført. Trafikksituasjonen må følges opp fortløpende. Nødvendige avbøtende tiltak for å sikre myke trafikanter må iverksettes i samråd med Vei og trafikk og/eller Viken fylkeskommune.’**

Etter dialog med BK Vei og trafikk og fylkeskommunen vil bl.a. følgende tiltak bli gjennomført sammen med Veidekke:

1. Informasjonsmøter med naboer og andre som bor og ferdes langs transportruten, herunder
  - Tanum skole
  - Tanum FUS barnehage
  - Bjørnegård skole
  - Tanum Vel
  - Sykkelklubb + ev. skiklubber
2. Til skolene er det ønskelig å stille med tyngre kjøretøy slik at barna kan se viktigheten av synlighet og øyekontakt ift. kjøretøyets blindsoner o.l.
3. Kjøre ‘Stopp-se-vink’ kampanje, der barna skal vinke til sjåføren for å få blikkontakt, de krysser ikke veien før sjåføren vinker tilbake
4. Kontrollstasjon ved anlegget, der sjåfør foretar inspeksjon av lass og tvillinghjul før utkjøring på offentlig vei
5. Opplæring sjåfører
6. Fortløpende oppfølging av trafikksituasjonen
7. Lyssignal ved utkjøring i Vestmarkveien



Sensor utløses ved utkjøring etter lasskontroll, og det varsles med blinkende lys oppstrøms i Vestmarkveien - i kombinasjon med dertil egnede skilt.






## Kattås K205 - Oversikt





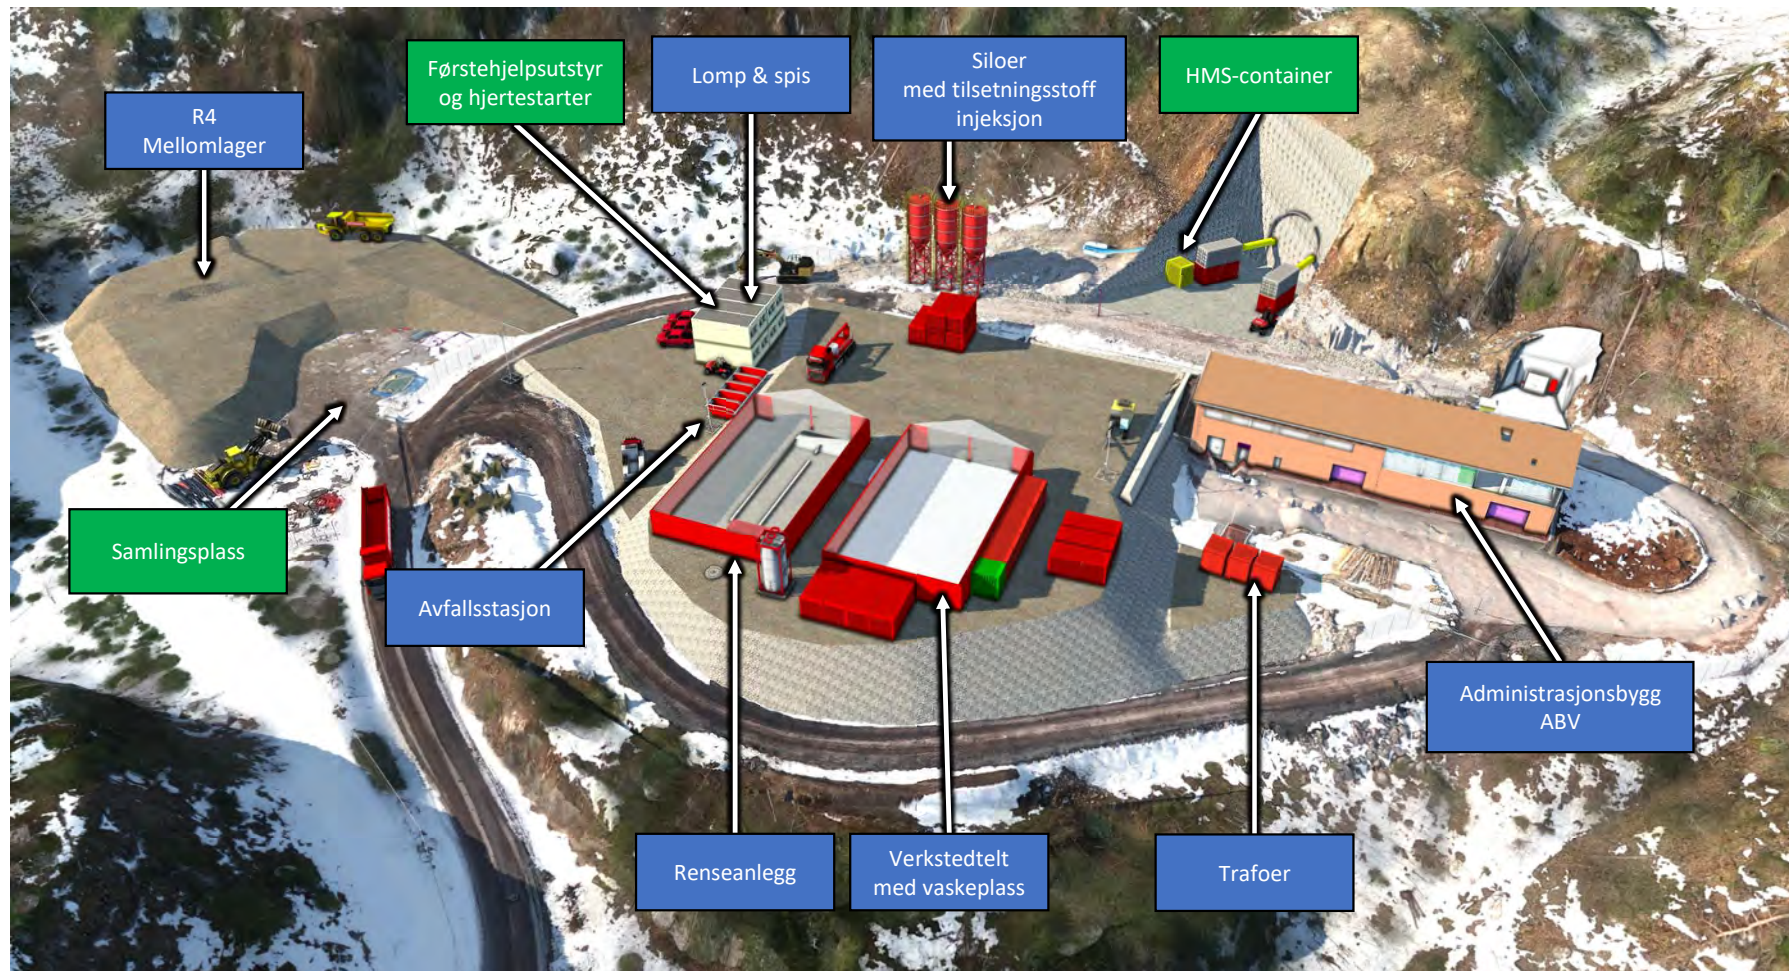

## Kattås - Riggplan R3







## Kattås – Riggplan R2



## Når bygger vi?

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b><u>2021 - 2022:</u></b> | Ferdigstille avløpsledning fra Kattås til Billingstad. |
| <b><u>2022:</u></b>        | Bergarbeider                                           |
| <b><u>2023:</u></b>        | Berg- og betongarbeider                                |
| <b><u>2024/2025:</u></b>   | Betong- og Tekniske arbeider i fjellhallene            |
| <b><u>2026:</u></b>        | Idriftsettelse                                         |
